

一般廃棄物処理施設建設工事

1、工事概要

工事名 一般廃棄物処理施設建設工事
工事場所 長野県 大町市 平 4608番地ほか
工期 平成 28年 3月 29日 ~ 平成 30年 7月 31日
構造 建物：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 4階建て 地上 約25m
 煙突：鉄骨造 地上 約59m

稼働台数は1日に稼働する最大数量を見込んでいます。毎日この台数が稼働する訳ではありません。


2、工事内容に伴う運搬車両の台数(抜粋)

工種	車種	稼働台数/日	総台数及び稼働時期
伐採	大型トラック (30m ³ /車)	約 4台/日	約 106台 H28.6月上旬～延べ約1ヶ月間
造成	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 56台/日	約 5,600台 H28.7月上旬～延べ約4ヶ月間 ※ 7台/日 × 8回/日 = 約 56台/日
地盤改良材	10tトラック	約 2～3台/日	約 102台 H28.10月下旬～延べ約2ヶ月間
砕石	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 4～5台/日	約 62台 H28.11月下旬～延べ約2ヶ月間
コンクリート	大型ミキサー車 (4m ³ /車)	約 100台/日 (月に1日又は2日)	約 1,102台 H28.12月中旬～延べ約3ヶ月間 ※ 100台/日程度の運転は工期中10日間程度の見込み
鉄筋	6tユニック	約 2～3台/日	約 99台 H28.11月下旬～延べ約3ヶ月間
鉄骨	10tトラック	約 4～5台/日	約 100台 H29.3月上旬～延べ約6ヶ月間
組積	10tトラック	約 2～3台/日	約 14台 H29.4月中旬～延べ約1ヶ月間
外壁材	大型トラック (100枚/車)	約 2台/日	約 8台 H29.5月上旬～延べ約1ヶ月間
路盤材	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 32台/日	約 1,102台 H28.10月下旬～延べ約3ヶ月間 ※ 4台/日 × 8回/日 = 約 32台/日
アスファルト合材	大型ダンプ (8t/車)	約 11台/日	約 154台 H30.2月下旬～延べ約1ヶ月間

※ 上記内容は工事に関わる全ての車両の台数ではありません。

3、工事工程表

※ 吹き出しは一部の工事の内容を記載しており、他の工事については省略しています。

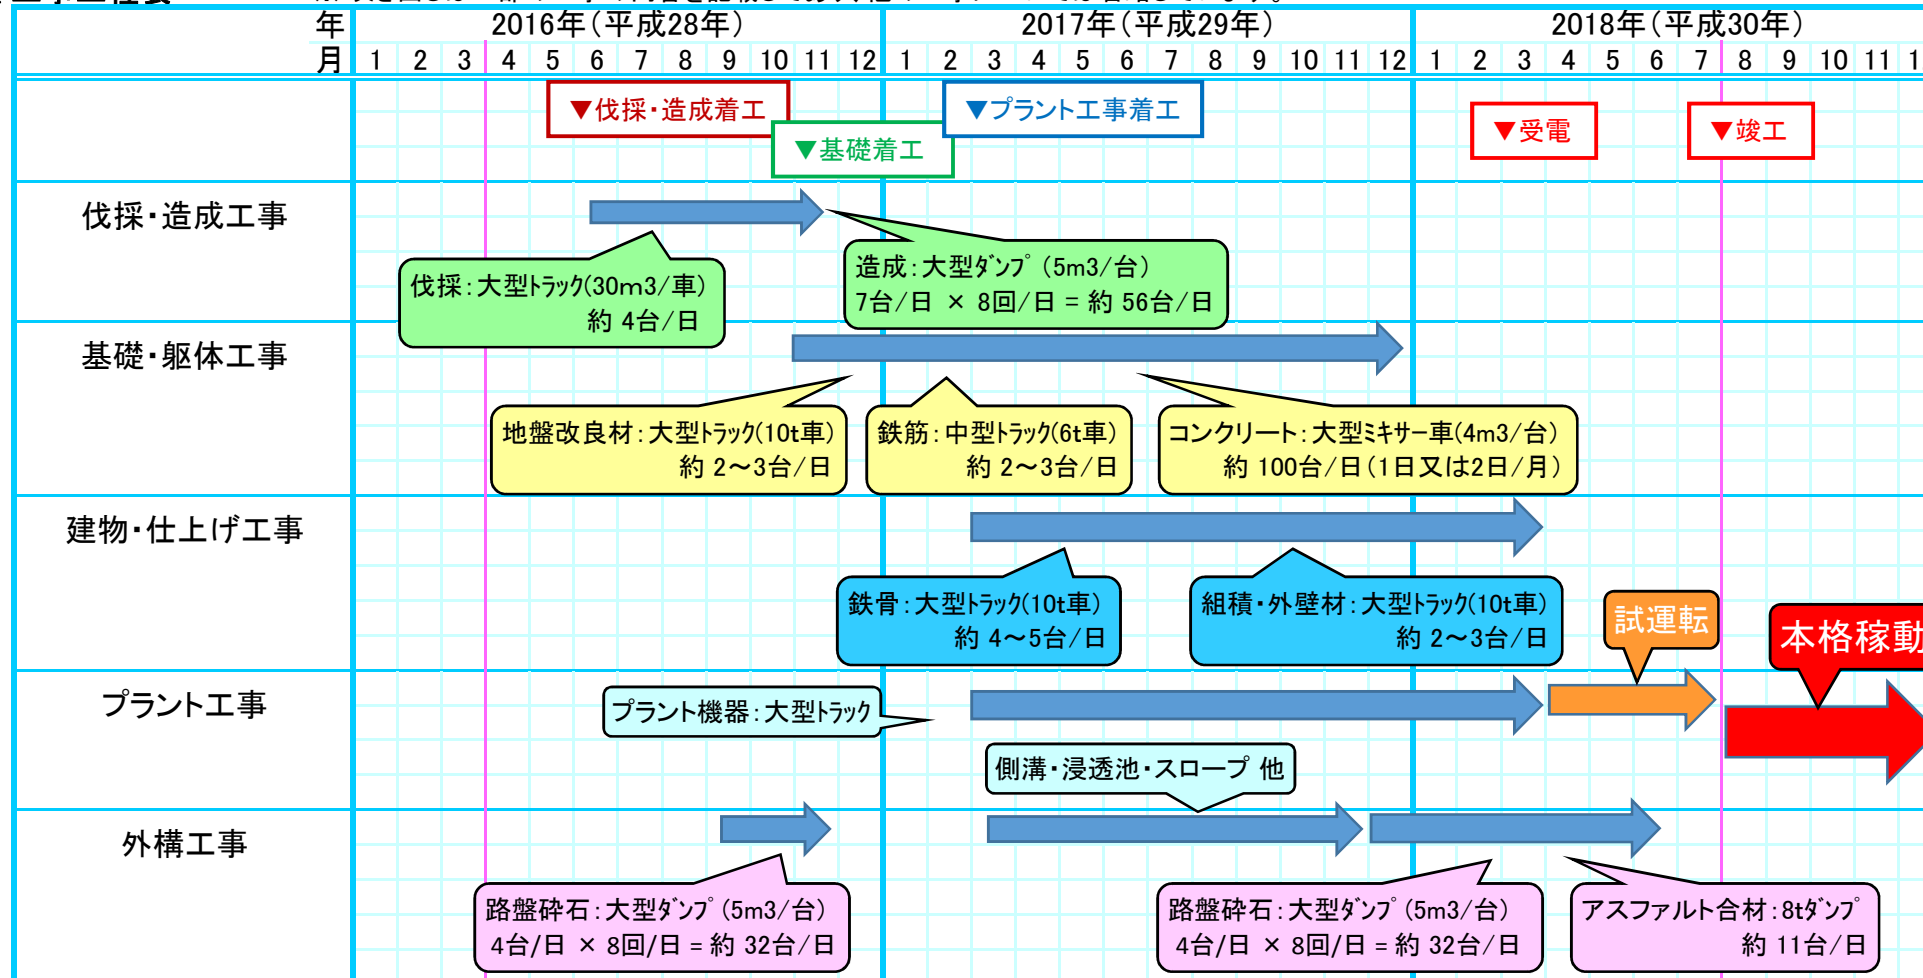

工事車両ルート(案)



- ※ 造成に使用する土砂(約 10,000m³)は鹿島地区からの搬入を予定しています。残りの土砂(約18,000m³)は骨材事業協同組合からの搬入を予定しています。
- ※ 工事の進捗状況により、土日・祝日にも工事を行なうことがあります。
- ※ 交通はおおむね 7:30 ~ 18:00 を予定しています。また、交通ルールを厳守いたします。
- ※ 夜間工事は基本的に行ないません。ただし、照明等が点灯している場合がございます。
