

# 一般廃棄物処理施設建設工事【平成28年度 12月】

平成28年11月21日 現在

## 1、工事概要

**工事名** 一般廃棄物処理施設建設工事  
**工事場所** 長野県 大町市 平 4608番地ほか  
**工期** 平成 28年 3月 29日 ~ 平成 30年 7月 31日  
**構造** 建物：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 4階建て 地上 約25m  
 煙突：鉄骨造 地上 約59m

稼働台数は1日に稼働する最大数量を見込んでいます。毎日この台数が稼働する訳ではありません。

## 2、工事内容に伴う運搬車両の台数(抜粋)

工種	車種	12月稼働台数/日	総台数及び稼働時期
造成	大型ダンプ (5m <sup>3</sup> /車)	約 24 台/日	約 5,600 台 H28.8月上旬~ H28.11月末、H29.4月~ ※ 3台/日 × 8回/日 = 約 24台/日
路盤材	大型ダンプ (5m <sup>3</sup> /車)	約 20 台/日	約 1,102 台 H28.11月上旬~H28.12月上旬、H29.10月~
地盤改良材	大型ハラセメント (14t/車)	約 3~4 台/日	約 102 台 H28.11月下旬~H29.1月中旬頃、H29.6月~
コンクリート	大型ミキサー車 (4m <sup>3</sup> /車)	約 70 台/日 (月に1日又は2日)	約 1,102 台 H28.12月中旬~H29.11月末までの期間 ※ 100台/日程度の運転は工期中10日間程度の見込み

※ 上記内容は工事に関わる全ての車両の台数ではありません。

### 盛土・砕石・コンクリートの搬入について

現在、造成工事用の土砂はほぼ搬入が終わっていますが11月末に鹿島地区①(建設地の北)からの採取を数日行なう予定です。12月以降での鹿島地区①・②からの土砂搬出は実施しません。平成29年4月以降で土砂搬出を行なう予定です。

路盤材・砕石等の骨材関係は大北骨材組合(建設地の南)からの搬入になります。台数の状況によりますが左記地図上の位置に監視員の配置を予定しています。


コンクリートはクミアイ生コン工場(建設地の南)からの搬入になります。左記地図上の位置に監視員の配置を予定しています。

ご理解とご協力をお願いします。



## 3、工事工程表

※ 吹き出しは一部の工事の内容を記載しており、他の工事については省略しています。

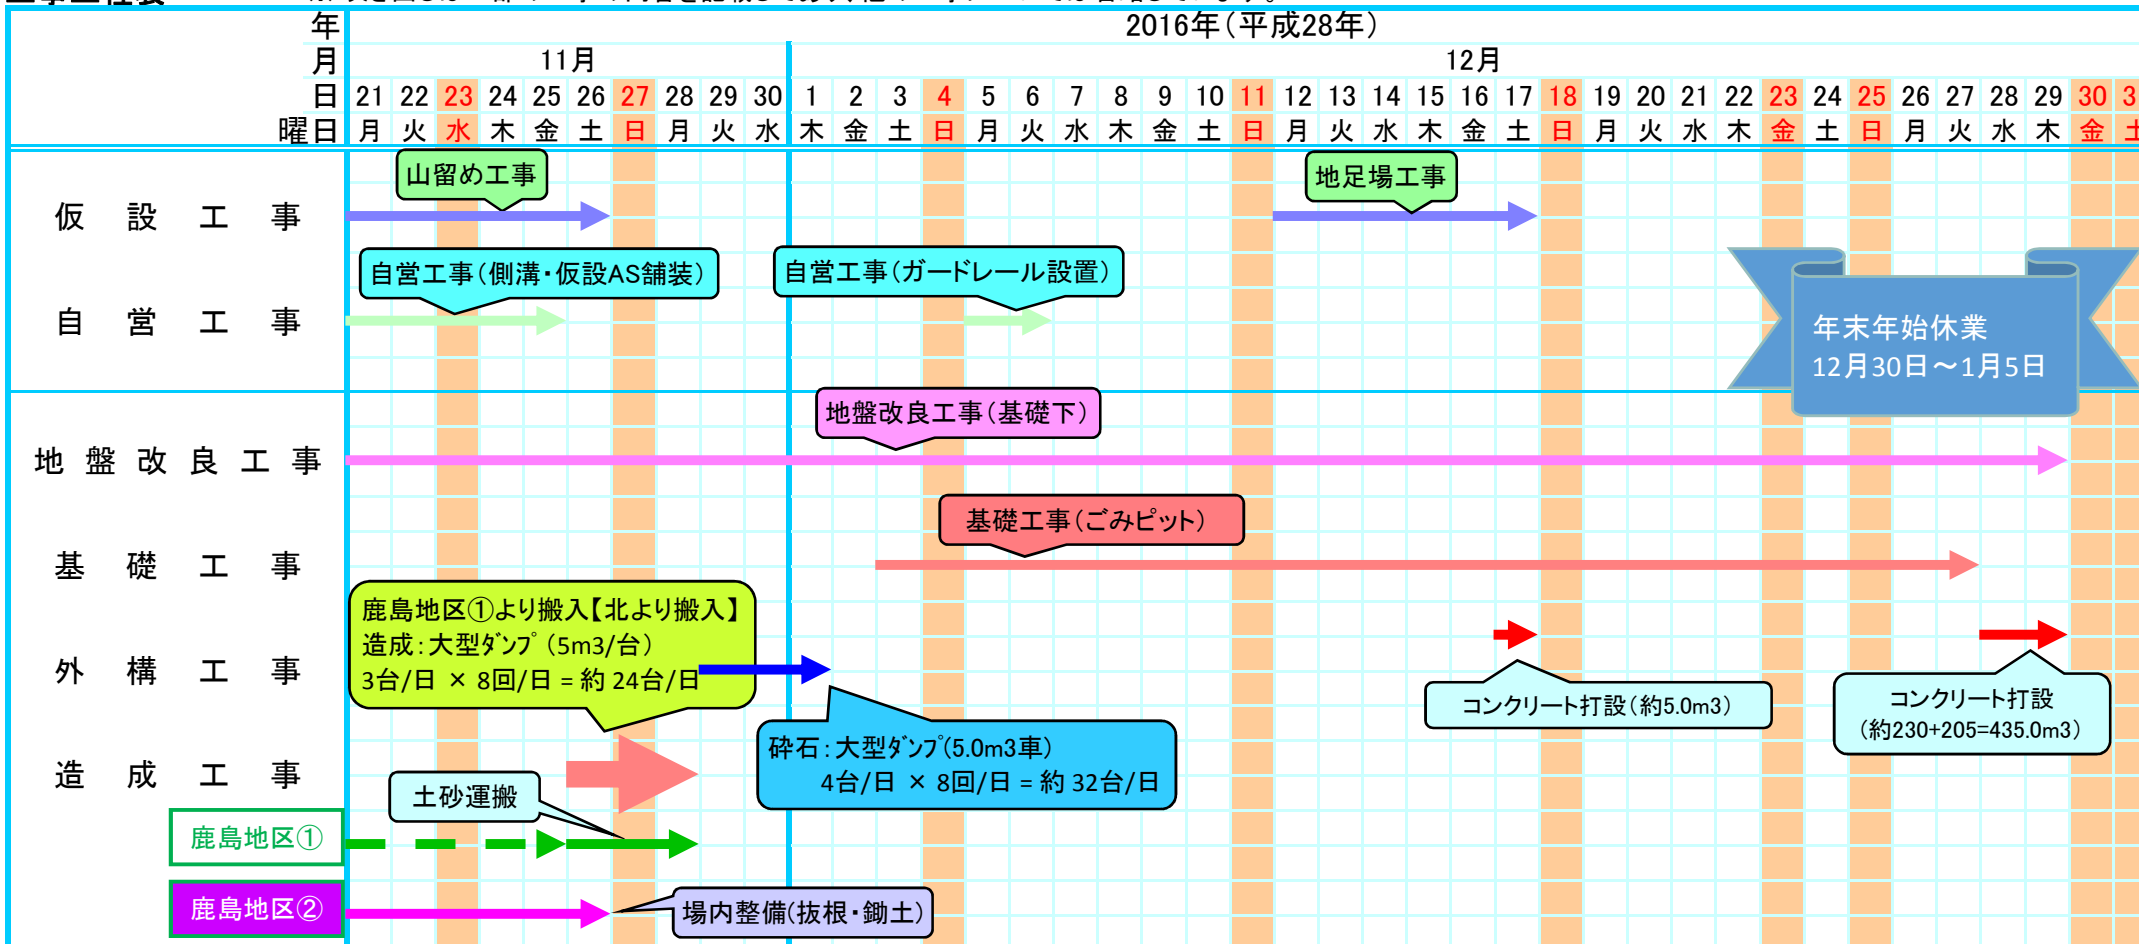

※ 矢印は日曜日も含まれていますが、基本的に休日となります。ただし、季節的な関係上日曜日の作業を行なう事もあります。(状況によっては大型車の交通があります。)土曜日・祝日は工事を行ないません。

※ 大型車の交通はおおむね 8:30 ~ 18:00 を予定しています。(コンクリート打設の状況によっては7:30以降ミキサー車の交通がある場合があります。)時速40kmを基本に運行します。

※ 現場出入口及び鹿島地区土砂搬出場所には誘導員を配置します。また、骨材搬入車両の台数の状況により監視員を配置する予定です。複数のコンクリートミキサー車が通行する日は監視員を配置します。

※ 土砂運搬は鹿島地区①からの運搬の予定です。12月から来年3月までの期間内での運搬は行ないません。

発行 北アルプス広域連合

施工 荏原・相模特定建設工事共同企業体
