

一般廃棄物処理施設建設工事【平成28年度 9月】

平成28年8月23日 現在

1、工事概要

工事名 一般廃棄物処理施設建設工事
工事場所 長野県 大町市 平 4608番地ほか
工期 平成 28年 3月 29日 ~ 平成 30年 7月 31日
構造 建物：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 4階建て 地上 約25m
 煙突：鉄骨造 地上 約59m

稼働台数は1日に稼働する最大数量を見込んでいます。毎日この台数が稼働する訳ではありません。

2、工事内容に伴う運搬車両の台数(抜粋)

工種	車種	稼働台数/日	総台数及び稼働時期
造成	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 56 台/日	約 5,600 台 H28.7月上旬～延べ約4ヶ月間 ※ 7台/日 × 8回/日 = 約 56台/日
コンクリート製品	10tトラック、	約 1~2 台/日	約 20 台 H28.9月中旬～延べ約1ヶ月間

※上記内容は工事に関わる全ての車両の台数ではありません。


盛土の搬入について

現在、造成工事用の土砂は鹿島地区①(建設地の北)からの採取を行なっています。鹿島地区①からの土砂搬出が完了した場合は鹿島地区②(黒沢橋付近)より引き続き土砂の搬出を予定しています。鹿島地区②(黒沢橋付近)において現在申請中であり許可が下りなかった場合は大北骨材組合(建設地の南)からの搬入の場合があるかもしれません。ご理解とご協力をお願いします。



3、工事工程表

※吹き出しは一部の工事の内容を記載しており、他の工事については省略しています。

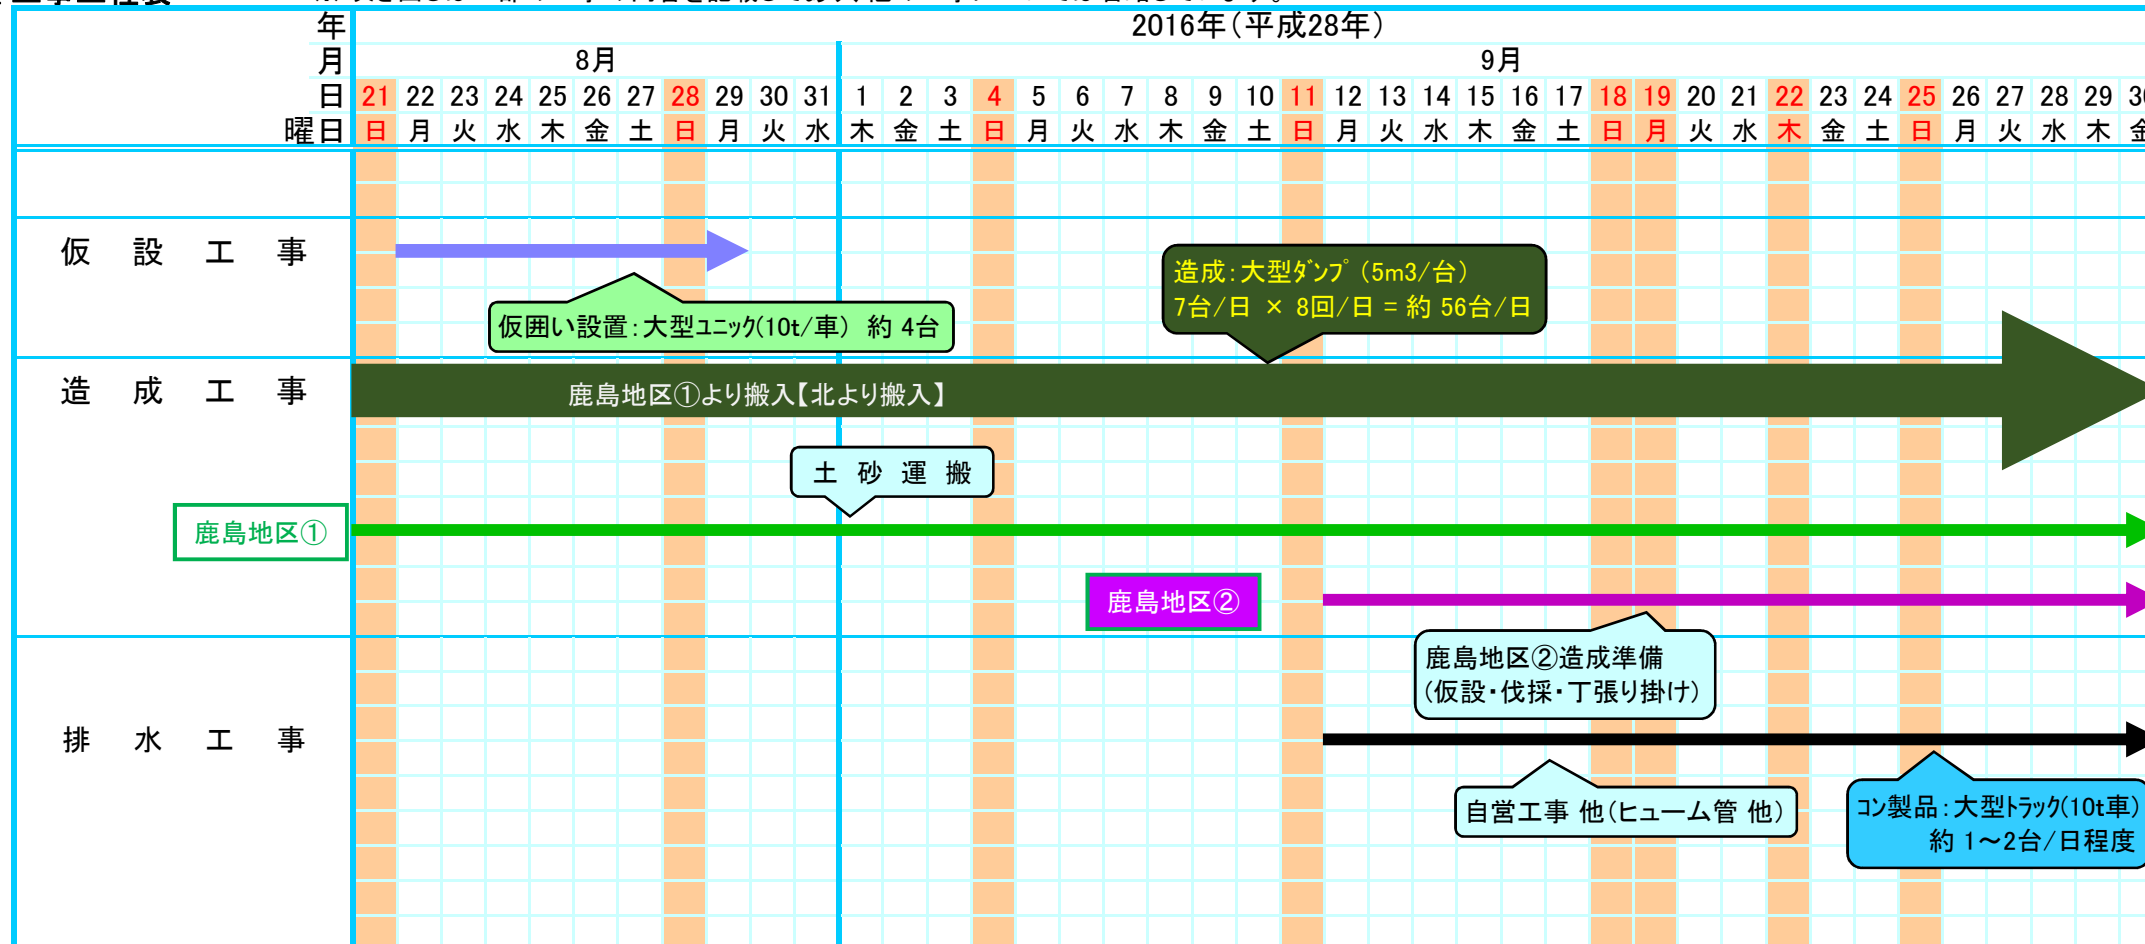

※ 矢印は日曜日も含まれていますが、基本的に休工期となります。土曜日・祝日は工事を行ないません。(お盆休業時は工事を行ないません。)

※ 天候不良の場合は土砂の運搬を行わない場合があります。

※ 大型車の交通はおおむね 8:30 ~ 18:00 を予定しています。時速40kmを基本に運行します。

※ 引き続き土砂運搬は鹿島地区①から搬入の予定です。鹿島地区①から土砂採取が完了した場合は、鹿島地区②(黒沢橋付近)からの運搬になります。状況により台数の増減があります。

※ 現場出入口及び鹿島地区土砂搬出場所には誘導員を配置します。

発行	北アルプス広域連合
施工	荏原・相模特定建設工事共同企業体
