

一般廃棄物処理施設建設工事【平成28年度 11月】

平成28年10月19日 現在

1、工事概要

工事名 一般廃棄物処理施設建設工事
工事場所 長野県 大町市 平 4608番地ほか
工期 平成 28年 3月 29日 ~ 平成 30年 7月 31日
構造 建物：鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 4階建て 地上 約25m
 煙突：鉄骨造 地上 約59m

稼働台数は1日に稼働する最大数量を見込んでいます。毎日この台数が稼働する訳ではありません。

2、工事内容に伴う運搬車両の台数(抜粋)

工種	車種	稼働台数/日	総台数及び稼働時期
造成	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 56 台/日	約 5,600 台 H28.7月上旬～延べ約4ヶ月間 ※ 7台/日 × 8回/日 = 約 56台/日
砕石	大型ダンプ (5m ³ /車)	約 4~5 台/日	約 62 台 H28.11月下旬～延べ約2ヶ月間
地盤改良材	10tトラック	約 2~3 台/日	約 102 台 H28.10月下旬～延べ約2ヶ月間

※上記内容は工事に関わる全ての車両の台数ではありません。


盛土の搬入について

現在、造成工事用の土砂は鹿島地区①(建設地の北)からの採取を行なっています。鹿島地区①からの土砂搬出が完了した場合は鹿島地区②(黒沢橋付近)より引き続き土砂の搬出を予定しています。砕石等の骨材関係は大北骨材組合(建設地の南)からの搬入になります。台数の状況により監視員の配置を予定しています。ご理解とご協力をお願いします。



3、工事工程表

※ 吹き出しは一部の工事の内容を記載しており、他の工事については省略しています。

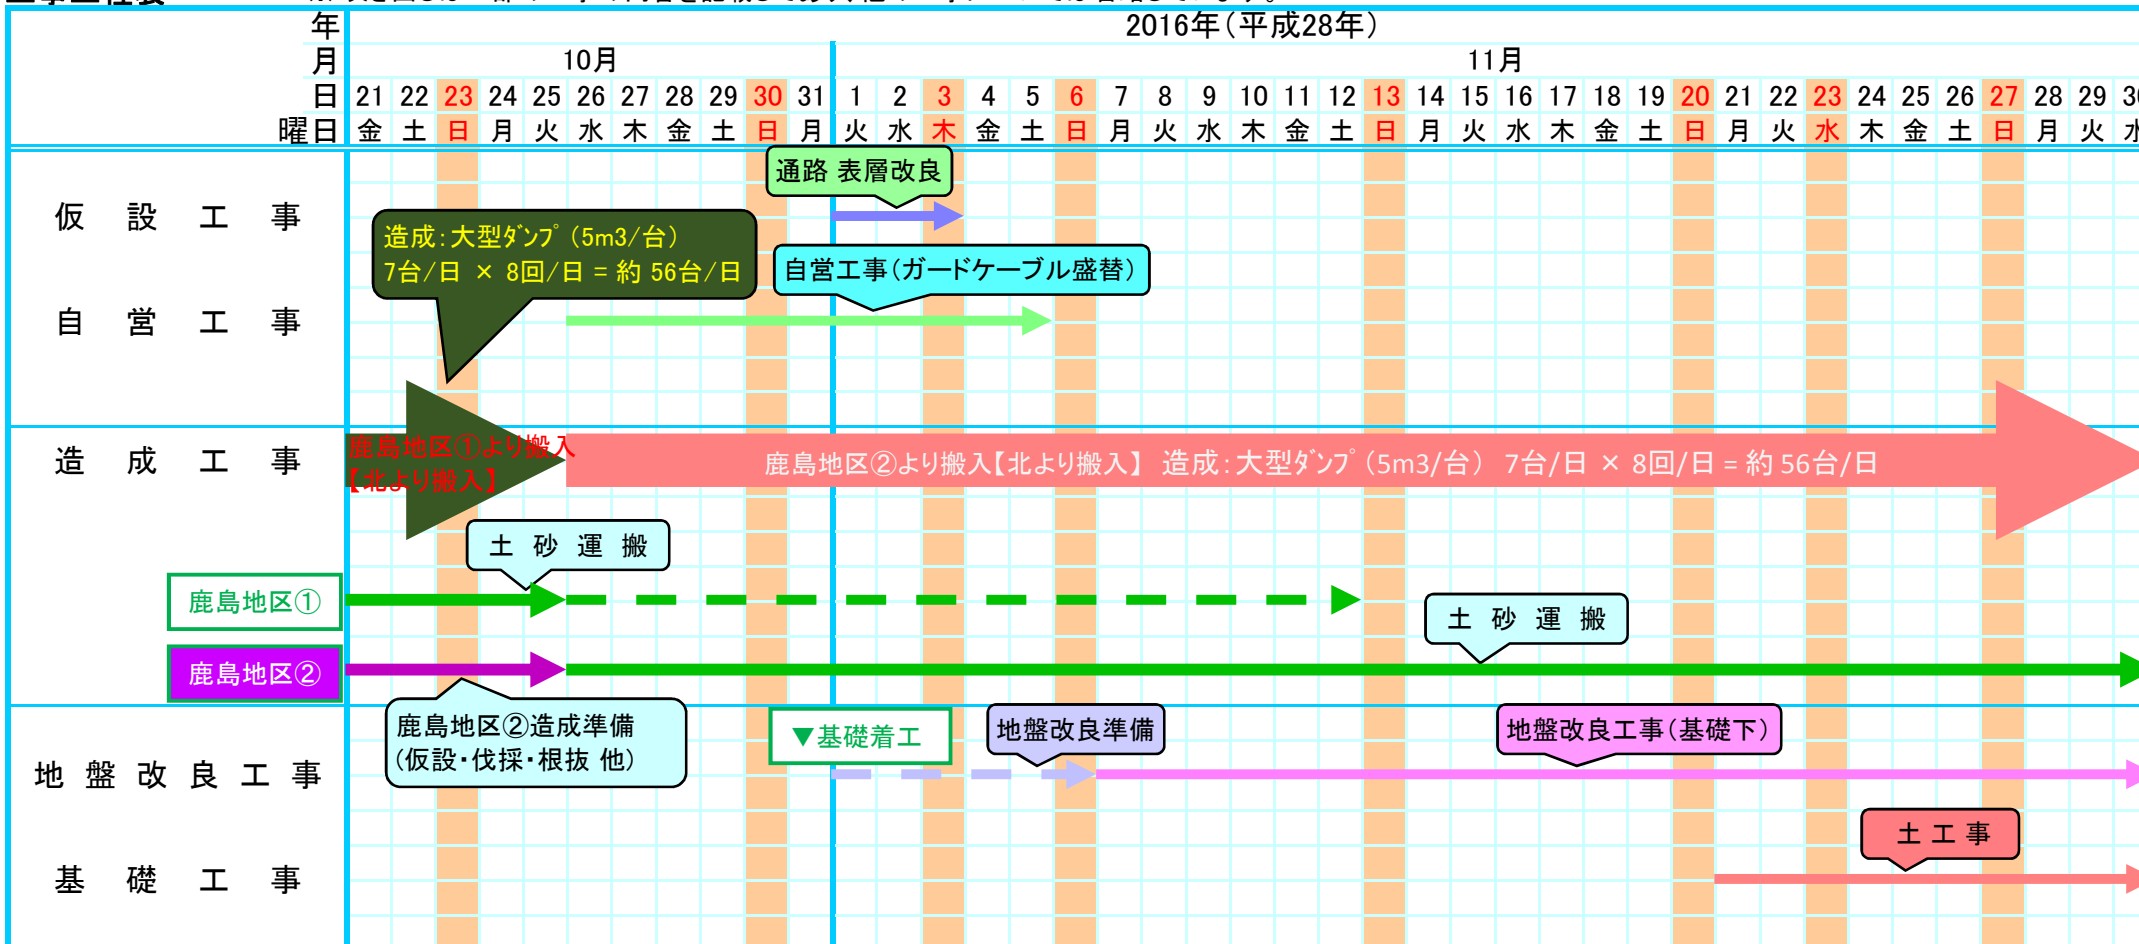

- ※ 矢印は日曜日も含まれていますが、基本的に休工期となります。土曜日・祝日は工事を行ないません。
- ※ 天候不良の場合は土砂の運搬を行わない場合があります。
- ※ 大型車の交通はおおむね 8:30 ~ 18:00 を予定しています。時速40kmを基本に運行します。
- ※ 引き続き土砂運搬は鹿島地区①から搬入の予定です。鹿島地区①から土砂採取が完了した場合は、鹿島地区②(黒沢橋付近)からの運搬になります。状況により台数の増減があります。
- ※ 現場出入口及び鹿島地区土砂搬出場所には誘導員を配置します。また、骨材搬入台数の状況により監視員を配置する予定です。

発行 北アルプス広域連合
 施工 荏原・相模特定建設工事共同企業体
